

نقيلهم برنامج عمل

الجماعة

2027-2022

السنة الأولى 2022

الفهرس

1.....	الفهرس
2.....	تقديم
4.....	منهجية إعداد برنامج عمل الجماعة
6.....	عرض تركيبي لبرنامج عمل الجماعة
9.....	التكلفة التقديرية للمشاريع:
13	تقدم تنزيل برنامج عمل الجماعة
26	تقييم تركيبي لتقدم تنفيذ برنامج العمل:

تقرير

بعد التأشير على برنامج عمل الجماعة بتاريخ 03 مارس 2023، وجب الوقوف على مدى تقدم الأوراش من خلال تقييم تنزيل البرنامج، ووتيرة تنفيذ الأوراش المتضمنة به. وتعزى أهمية التقييم السنوي لتنفيذ برنامج العمل لأغترابيين أساسيين:

1. الضرورة القانونية: تنص المادة 14 من المرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 29 يونيو 2016 والمتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتعبه وتعيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده على أن رئيس المجلس يقوم بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة.
2. نجاحة التدبير: بالإضافة لكونه وثيقة عمل داخلية يمكن اغترابه أيضا أداة للقيادة وقناة للإشراك وبالتالي ورقة بوظائف متعددة:

* وثيقة عمل:

- ✓ لتتبع تنفيذ برنامج العمل.
- ✓ لرأسمة إجراءات التدبير بالمشروع ومراقبة التعلقات من الإخفاقات.
- ✓ للتبادل والمقارنة في المجال وفي الزمن مع باقي الجماعات.
- ✓ لتدقيق وتقييم اسهامات الشركاء

* وثيقة للقيادة :

- ✓ تدبير العلاقة مع شركاء الإنجاز والتفاعل
- ✓ وضع منهجية المشروع في التنزيل
- ✓ وضع مؤشرات تقدم واضحة وبسيطة للإنجاز
- ✓ للتقويم وتعديل برنامج

* وثيقة الإشراف:

- ✓ في إطار الإخبار والتشاور والمشاركة.
- ✓ لتقاسم النجاح والأخفاق.
- ✓ لاستخلاص الصعوبات وإعادة تجديد الحاجيات بخصوص العلاقة مع الشركاء.

يجب التأكيد أيضا على أن التقييم السنوي محطة، بمنطق السيرورة "processus"، ضمن عمل المجلس على امتداد مدة انتدابه، وبالتالي وجب التفاعل مع مخرجاته بارتباط مع محطات أخرى، أهمها مسار إقرار برنامج العمل من طرف المجلس والتأشير عليه من طرف سلطة المراقبة الإدارية، حيث:

- ✓ تم التداول بشأنه خلال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2022 المنعقدة بتاريخ 29 دجنبر 2022.
- ✓ تم إرساله إلى مصالح العمالة قصد التأشير بتاريخ 14 فبراير 2023.
- ✓ تم التأشير عليه بتاريخ 03 مارس 2023 وتوصلنا به بتاريخ 09 مارس 2023.

منهجية إعداد برنامج عمل الجماعة

نص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في المادة 78 على ما يلي: تضع الجماعة تحت إشرافه رئيس مجلسها برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.

بناء عليه، تم إعداد برنامج عمل الجماعة بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وفي التقائية مع برنامج عمل مجلس عمالة انزكان أيت ملول، وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل عمالة انزكان أيت ملول بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح الامركزية للإدارة المركزية.

انسجاما مع روح نص المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتبعه وتعيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور طبقا لمقتضيات المادة 81 من ذات القانون التنظيمي المشار إليه سلفا، وبشكل خاص مادته السابعة: "يتم إعداد برنامج العمل وفق منهج تشاركي"،

هكذا تم إعداد برنامج عمل جماعة انزكان، وفق مجموعة من الأدوات المنهجية التي مكنتها من الانتقال من الإعداد النظري الى التنزيل والأجراة الفعلية لكل العمليات المشكلة لسيرورة بلورة برنامج العمل، وعموما يمكن حصر الأدوات المنهجية المستعملة فيما يلي:

✓ نموذج SWOT

✓ المجموعات البورية التي تم استعمالها خلال التشخيص التشاركي

✓ المقابلات الفردية والجماعية مع مجموعة من الفاعلين ولاسيما الجمعيات

وبعد التشخيص الترايبي للمرحلة الأولى لعملية إعداد برنامج عمل الجماعة وبالتالي إنتاج المشاريع التنموية، وهو يعني من منظور التنمية إجراء الملاحظات والجرد الشاملين لمجموع مكونات المجال الترايبي.




أما ميادين التشخيص فقد انصبت أثناء إعداد برنامج عمل الجماعة على المستويات التالية:

- الإطار الترايبي: بمعنى الرقعة الترايبية المعنية بالتنمية.
 - الحقل الاجتماعي: وهو مجموع السكان الذين يقطنون بالمجال الترايبي والذين تجمعهم علاقات متنوعة ومتعددة ويتقاسمون نفس القيم والمسؤوليات ويواجهون نفس المشاكل.
 - الحقل الاقتصادي: ويشمل الموارد الاقتصادية المتوفرة لدى الجماعة إما فعلياً أو التي يمكن تعبئتها.
- أما أصناف التشخيص المعتمد فهي:
- ❖ التشخيص البيليوغرافي والوثائقي: يتضمن قراءة تحليلية لمنوغرافية الجماعة، تقييم برنامج العمل السابق، وكذا دراسة وتحليل الوثائق ذات الصلة الممسوكة لدى المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية.
 - ❖ التشخيص الترايبي: والمتجسد من خلال المجموعات البؤرية وورشات التشخيص التشاركي.
 - ❖ التشخيص المالي: انصب بشكل أساسي على الإمكانيات المادية للجماعة "المداخل والنفقات" الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة.

عرض تركيب لبرنامج عمل الجماعة

1. تركيبية برنامج العمل

- **المشاريع الذاتية**
- **المشاريع المشتركة**
- **مشاريع للترافع**



المشاريع الذاتية:

تتضمن ما يلي:

04

البرامج

14

المشاريع

74

الأوراق

المشاريع الذاتية:

البرنامج 1 البنية التحتية والتجهيزات الأساسية 6 مشاريع 44 ورشة

البرنامج 2 تنمية الاقتصاد وتعزيز جاذبية المجال 1 مشروع 7 اوراش

البرنامج 3 تجويد الخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيهية 4 مشاريع 11 ورشة

البرنامج 4 تأهيل البنيات الإدارية وتأهيل الإدارة 3 مشاريع 12 ورشة


التكلفة التقديرية للمشاريع:

المشاريع الذاتية :

النسبة المئوية لكل برنامج في الكلفة الاجمالية	الكلفة التقديرية الاجمالية (مليون درهم)	عدد الاوراش	البرنامج
65%	126.69	44	البنية التحتية والتجهيزات الاساسية
18%	34.3	7	تنمية الاقتصاد وتعزيز جاذبية المجال
11%	21.5	11	تجويد الخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيهية
6 %	11.5	12	تأهيل البنيات الإدارية وتأهيل الإدارة
100 %	193.99	74	المجموع

النسبة المئوية التي يمثلها كل برنامج في العدد الاجمالي للاوراش


تأهيل البنيات الإدارية وتأهيل
الإدارة
%17

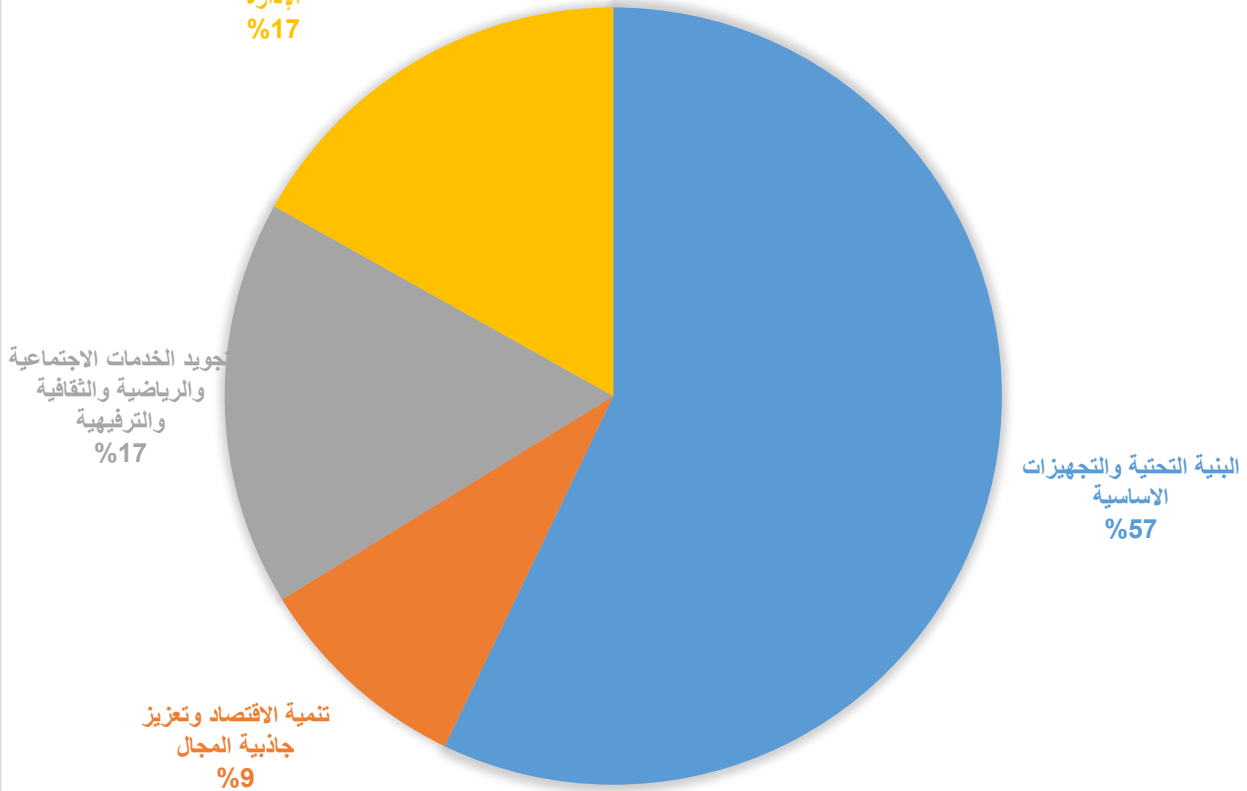

النسب التي يمثلها كل برنامج على حدة في الكلفة الاجمالية التقديرية

تأهيل البنيات الإدارية
وتأهيل الإدارة
%6


تجويد الخدمات الاجتماعية
والرياضية والثقافية
والترفيهية
%11

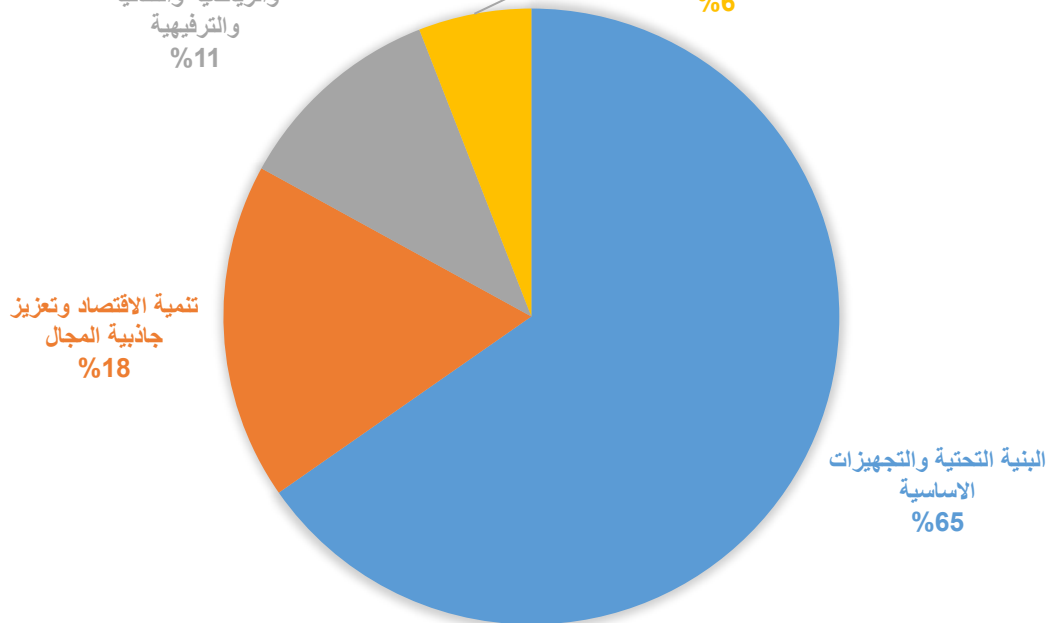

المشاريع المشتركة:


العدد	طبيعة المشاريع
26	مشاريع في إطار اتفاقية سياسة المدينة لتأهيل مدينة إنزكان
25	مشاريع مشتركة أخرى
51	المجموع

النسبة المئوية للمشاريع المشتركة



مشاريع الترافع:

عدد المشاريع	الكلفة التقديرية الاجمالية (مليون درهم)
8	124



تقدم تنزيل برنامج عمل الجماعة

تقييم السنة الأولى 2022

مصفوفة المشاريع الذاتية:

1. برنامج تقوية البنيات والتجهيزات الأساسية:

المشاريع	الاوراش (او العمليات)	حصة الجماعة المتوقعة أو الملتزم بها (مليون درهم)	المبالغ المقررة برسم سنة 2022	الإجراءات المتخذة
1.1 الدراسات المرتبطة بالبنيات التحتية والتجهيزات الاساسية	انجاز الدراسات لمختلف مشاريع البنيات التحتية	1,94	0.14	انجز الورش من خلال سند الطلب المتعلق باعداد الدراسات الخاصة بالمياه العادمة المعالجة.
	انجاز الدراسات اللازمة لمختلف مشاريع التجهيزات الأساسية	1,7	-	-
	الصيانة الاعتيادية للطرق	11,5	1.5	انجز الورش من خلال الصفقة رقم 2022/04. وتم تسلم الأشغال
	تهيئة المدارة بين الطريق الدائري والقنطرة الجديدة	1.6	-	-
	تهيئة مرید أمام سوق الحرية	2.4	-	-
2.1 البنيات التيحتية	تهيئة الطريق حمام الشياضي أمام الإقامة العاملية بالجرف	1.5	-	-
	تأهيل المقطع الطرقي بشارع الحسن الثاني بإنزكان	1	-	-
	تهيئة شارع المختار السوسي	5	-	-

-	-	6	تهينة شوارع (كسيمة، المدارس، مسكينة، اشتوكة)	
-	-	3	تهينة مختلف مدارات المدينة	
-	-	12	اشغال تبليط الازقة	
-	-	6	تهينة المرابد بالمدينة	
انجز الورش من خلال الصفقة رقم 2022/02 وتم تسلم التوريدات	1.4	11.4	اقتناء عتاد صيانة الانارة العمومية	3.1 الانارة العمومية
	-	6.4	تقوية وتوسيع شبكة الانارة العمومية بالمدينة	
في طور انجاز الورش من خلال الصفقة 2022/07 حيث تم إصدار امر بالتوقف في طور صدور أمر بالخدمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء.	0,85	1.7	ازالة وتحويل الاعمدة الاسمنتية بأزقة المدينة	
تم انجاز الورش من خلال الصفقة عدد 2022/06 وتم تسلم التوريدات	0,5	2	التشوير الأفقي والعمودي	4.1 التشوير الطرقي
تم انجاز الورش من خلال الصفقة عدد 2022/17 وتم تسلم التوريدات	0.35	1.85	علامات الاتجاه	
-	-	0.3	اقتناء لوحات ترقيم الأزقة	
تم انجاز الورش من خلال الصفقة عدد 2022/12 وتسلم الأشغال	0,45	2.4	مخفضات السرعة	
الصفقة عدد 2022/19 فسحها	0,6	3,6	صيانة المناطق الخضراء	5.1 المناطق الخضراء والساحات وملاعب القرب
-	-	1.5	تأهيل حديقة 20 غشت وحديقتين بالجرف	
-	-	1.6	تأهيل حديقة ابن طفيل	
-	-	0.8	تهينة حديقة المغرب العربي	
-	-	0.6	تهينة الحديقة بشارع محمد الخامس	
-	-	0.8	تهينة حديقة الأمويين	

-	-	10	تهيئة الشريط الأخضر بالجرف	5.1 المناطق الخضراء والساحات وملاعب القرب
-	-	6	تهيئة فضاء ترفيهي بجانب الكولف	
-	-	0.3	تهيئة حديقة بجانب مقبرة تراست	
-	-	3	تهيئة الشريط الأخضر على طريق مولاي علي الشريف	
-	-	0.3	تهيئة حديقة أمام مدرسة النخيل	
-	-	4,5	توسيع شبكة المياه العادمة المعالجة لسقي المناطق الخضراء	
-	-	1.8	تهيئة ساحة مقر جماعة انزكان	
-	-	3	تهيئة ساحات عمومية بأحياء المدينة	
-	-	1	احداث ثلاث ملاعب للقرب بملعب انزكان	
-	-	1	احداث ثلاث ملاعب للقرب بملعب تراست	
-	-	0.5	تأهيل ملعب القرب أمام مقاطعة الجرف	
-	-	1	إحداث ملعب القرب أمام مؤسسة المتنبى	
-	-	1	إحداث ملعب القرب بتراست (أمام المحافظة)	
-	-	0.5	تأهيل ملعب الحي الحسني -تغزوت - بانزكان	
-	-	0.5	تأهيل مساحة اللعب قرب مؤسسة رحال ابن احمد الرمل	
-	-	0.5	تأهيل ملعب قرب مقبرة الجرف	
-	-	2	حواجز وقائية	6.1 التآييث الحضري
أنجز الورش عن طريق سند الطلب	0,2	1,1	كراسي حضرية	
-	-	0.1	اقتناء خيم	

2. برنامج تنمية الاقتصاد وتعزيز جاذبية المجال:

المشاريع	الاوراش (او العمليات)	حصة الجماعة المتوقعة أو الملتزم بها (مليون درهم)	المبالغ المقررة برسم سنة 2022	الإجراءات المتخذة
1.2 التنمية التجارية والاقتصادية	توسيع سوق الخضر والفواكه للجملة ونصف الجملة	24	-	-
	إحداث محطة تحويل كهربائي بسوق الخضر والفواكه للجملة ونصف الجملة	2	-	-
	تأهيل الجناح 8 بسوق الثلاثاء	3,6	-	-
	تأهيل سوق الثلاثاء	1	-	-
	إحداث محطة تحويل كهربائي بسوق الثلاثاء	1.4	-	-
	تأهيل السوق الأسبوعي الجديد	1	-	-
	تأهيل المحطة الطرقية المؤقتة	1.3	-	-


3. برنامج تجويد الخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيهية:

المشاريع	الاوراش (او العمليات)	حصة الجماعة المتوقعة أو الملتزم بها (مليون درهم)	المبالغ المقررة برسم سنة 2022	الاجراءات المتخذة
1.3 المركبات الاجتماعية	تجهيز المركب الاجتماعي بتراس	0.6	-	-
	تجهيز دار الحي بالجرف	0.4	-	-
2.3 الملاعب الرياضية	انزكان	0.9	-	-
	الجرف	1.7	-	-
	تراس	1	-	-
	تهينة واجهة ملعب انزكان	3	-	-
	تأهيل القاعة متعددة الخدمات انزكان (عبد القادر بن محمد أوبيهي)	2	-	-
	تأهيل وصيانة قاعة عبد القادر بن محمد اوبيهي	0.3	-	-
	بناء القاعة المغطاة للرياضة بتراس	7,5	-	-
3.3 الخدمات الثقافية	إعادة تأهيل الصالون الثقافي	0,5	-	-
	تهينة وتجهيز المسرح الجماعي	0,4	-	-
4,3 الخدمات الترفيهية	تجهيز الساحات والمناطق الخضراء بالألعاب الأطفال	1.2	-	-
	تجهيز الساحات والمناطق الخضراء بالتجهيزات الرياضية	2	-	-

4. برنامج تأهيل البنيات الإدارية وتحديث الإدارة:

المشاريع	الاوراش (او العمليات)	حصة الجماعة المتوقعة أو الملتزم بها (مليون درهم)	المبالغ المقررة برسم سنة 2022	الاجراءات المتخذة
1,4 تحديث الإدارة	انشاء الموقع الالكتروني للجماعة	0,1	-	انجز الورش من خلال سند الطلب المتعلق بإحداث موقع الكتروني رسمي للجماعة SITE WEB
2,4 تأهيل البنيات الإدارية	اقتناء العتاد المعلوماتي والبرانيم	2,2	-	-
	تجهيزات مكتبية	0,3	-	-
	تأهيل قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة	0,8	-	-
	اقتناء سيارات نفعية	0,85	-	-
2,4 تأهيل البنيات الإدارية	تأهيل المحجز الجماعي	1	-	-
	تأهيل المستودع الجماعي	0,9	-	-
	تجهيز مرافق الجماعة بكاميرات المراقبة	0,4	-	-
	بناء ملحقة ادارية بالجرف قرب بريد المغرب	1,3	-	-
	إعادة بناء ملحقة ادارية بتراست	3	-	-
3,4 التكوين المستمر	تجهيز مقر تصحيح الامضاء بالجرف	0,2	-	-
	التكوين المستمر	0,45	-	-

عدد الأوراش المبرمجة الخاصة بالمشاريع الذاتية خلال سنة 2022: 10

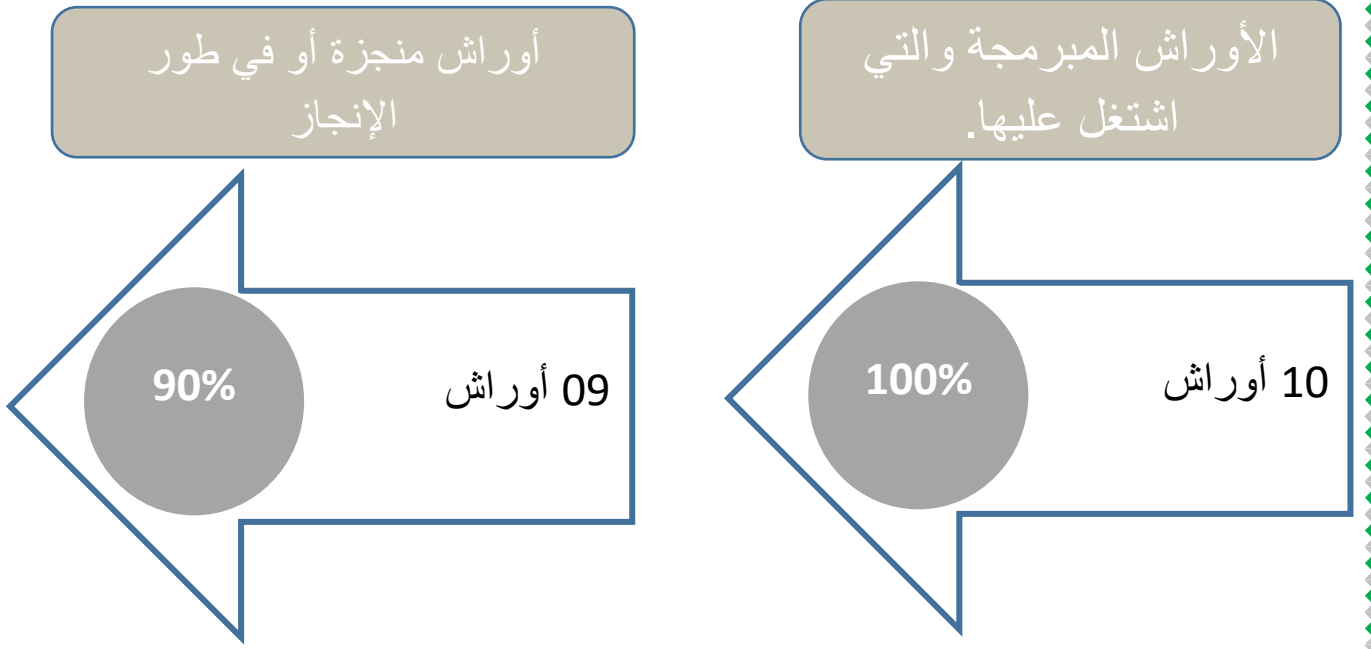

<u>المفسوخة</u>	<u>المنجزة</u>	<u>عدد الأوراش</u>
01	09	10

مصفوفة المشاريع المشتركة:

المشروع	التكلفة التقديرية للمشروع	الشركاء ومساهماتهم المالية	الاجراءات التنفيذية المتخذة خلال سنة 2022
احداث وحدة القرب للذبح والبيع لفائدة أصحاب الدواجن	7 100 000.00	- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : 4 000 000.00 - جماعة انزكان: 1 200 000.00 - المستفيدين : 1 900 000.00	تمت المصادقة على اتفاقية الشراكة لأجل إحداث هذا المرفق تم فتح أظرفة طلب عروض الدراسات المعمارية الصفقة المتعلقة بالدراسات المعمارية في طور الالتزام بالنفقة
احداث وحدة للقرب لتتقية المنتجات البحرية لفائدة منظفي الأسماك	2 000 000.00	- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : 2 000 000.00 - جماعة انزكان (توفير العقار)	تم المصادقة على اتفاقية الشراكة من أجل إحداث هذا المرفق. ملف طلب العروض المتعلق بالدراسات المعمارية في طور الاعلان الصفقة المتعلقة بالدراسات المعمارية في طور الالتزام بالنفقة
أشغال وضع الولوجيات على مستوى المركز الحضري لمدينة انزكان	2 500 000.00	- جماعة انزكان: 2 000 000.00 - المجلس عمالة انزكان أيت ملول 500 000.00	تمت المصادقة على اتفاقية الشراكة الخاصة بالمشروع تمت برمجة مبلغ المساهمة الخاص بالجماعة.
أشغال بناء ملعب القرب بثانوية حسن الخياط	1 400 000.00	- جماعة انزكان: 800 000,00 - المجلس الإقليمي: 600 000,00	تم استكمال مسطرة طلب العروض الصفقة المتعلقة بالمشروع في طور الالتزام بالنفقة
دراسة وأشغال بناء منشأة فنية على مستوى واد سوس بالطريق الجديدة التي تربط حي النخيل بإنزكان وحي تمزات بأيت ملول	36 000 000.00	- جهة سوس ماسة: 14 000 000,00 - مجلس عمالة انزكان أيت ملول: 5 000 000,00 - جماعة انزكان: 10 000 000,00 - جماعة أيت ملول: 7 000 000,00	تم صرف مبلغ المساهمة الخاص بالجماعة تم انطلاق الأشغال بتاريخ 27 اكتوبر 2023 بعد اتمام الدراسة التقنية من طرف مجلس جهة سوس ماسة .
أشغال بناء السويقة الجديدة بتراست	15 000 000.00	- جماعة انزكان: 7 000 000.00 - الشركاء: 8 000 000.00	تمت برمجة مبلغ 3 600 000.00 درهم في طور إعداد ملف الدراسات المعمارية

في إطار استكمال إجراءات تسلم العقار وفق مقتضيات الاتفاقية	- جماعة انزكان: 4 000 000,00 - الشركاء: 6 000 000,00	10 000 000.00	أشغال بناء السوق النموذجي بالجرف
تمت برمجة مبلغ مساهمة الجماعة	- جماعة انزكان: 1 800 000.00 - الشركاء: 700 000.00	2 500 000.00	تأهيل السويقة القديمة بتراسات
في طور توفير العقار	- جماعة انزكان: 2 000 000,00 - باقي الشركاء: 4 000 000,00	6 000 000,00	أشغال بناء مسبح نصف اولمبي بإنزكان
في طور توفير العقار	- جماعة انزكان: 2 000 000,00 - باقي الشركاء: 2 000 000,00	4 000 000.00	أشغال بناء مسبح بالجرف
تم فتح أظرفة الصفقة المتعلقة بالدراسة التقنية المتعلقة بالتهيئة الحضرية للمدينة والتي تشمل الدراسة التقنية الخاصة بالمشروع	- جماعة انزكان: 2 000 000,00 - باقي الشركاء: 5 000 000,00	7 000 000.00	الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية بالطريق الدائري بانزكان
في طور التسوية العقارية مع الجماعات السلالية الدراسة التقنية الخاصة بالمشروع في طور الالتزام بالنفقة	- جماعة انزكان: 3 000 000,00 - باقي الشركاء: 4 000 000,00	7 000 000.00	احداث الملعب الكبير قرب ساحة السعادة بانزكان
الدراسة التقنية الخاصة بالمشروع في طور الإنجاز من طرف مجلس عمالة انزكان أيت ملول	- جماعة انزكان : 600 000,00 - المجلس الاقليمي: 1 000 000.00 - جماعة ايت ملول: 200 000.00	1 800 000.00	الدراسة التقنية لبناء الحاجز الوقائي بالضفة اليمنى بواد سوس
تم إعطاء انطلاق المشروع من طرف مجلس عمالة انزكان أيت ملول بصفته صاحب المشروع	- جماعة انزكان : 1 000 000,00 - المجلس الاقليمي: 1 500 000.00 - وزارة البيئة : 7 500 000.00	10 000 000.00	مشروع تنقية ضفاف واد سوس من النفايات الهامدة
تمت المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمشروع تم صرف الاعتماد الخاص بمساهمة الجماعة. المشروع في طور استكمال الدراسات المعمارية والتقنية من طرف مجلس جهة سوس ماسة	- جماعة انزكان: 2 000 000.00 - وزارة الثقافة : 12 000 000.00 - جهة سوس ماسة : 4 000 000.00 - مجلس عمالة انزكان أيت ملول : 2 000 000.00	24 000 000.00	تاهيل قسبة انزكان



	- الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الاركان : 4 000 000.00		
في طور توفير العقار والاعتمادات المالية	- جماعة انزكان: 1 000 000.00 - باقي الشركاء: 500 000.00	1 500 000.00	احداث ملاعب كرة التنس
في طور توقيع الاتفاقية من طرف الشركاء	- جماعة انزكان: 10 000 000.00 - جماعة أيت ملول : - وزارة الصحة : - باقي الشركاء:	150 000 000.00	بناء مستشفى اقليمي بأيت ملول
تمت برمجة مبلغ المساهمة في طور توقيع الاتفاقية	- جماعة انزكان: 2 000 000.00 - وزارة الصحة : 500 000.00	2 500 000.00	بناء وتجهيز المركز الصحي الحضري بالرمل انزكان
تمت برمجة مبلغ المساهمة في طور توقيع الاتفاقية	- جماعة انزكان: 2 000 000.00 - وزارة الصحة 500 000.00	2 500 000.00	بناء وتجهيز المركز الصحي الحضري بتراست انزكان
في طور توقيع الاتفاقية من طرف الشركاء	- جماعة انزكان: 1 500 000.00 - جماعة ايت ملول 1 500 000.00 - جماعة الدشيرة: 1 500 000.00 - المجلس الجهوي لسوس ماسة : 1 500 000.00 - وزارة الصحة : 3 000 000.00	9 000 000.00	تأهيل مصلحة الجراحة والتطبيب بالمركز الاستشفائي الاقليمي
تم صرف مبلغ المساهمة الدراسة التقنية في طور الإنجاز من طرف مجلس عمالة انزكان ايت ملول	- مجلس جماعة انزكان أيت ملول 1 000 000.00 - جماعة انزكان : 600 000.00 - جماعة أيت ملول : 200 000.00	1 800 000.00	انجاز دراسة تقنية لتهيئة وحماية ضفاف واد سوس من الفيضانات على مستوى جماعتي انزكان وأيت ملول
تم توفير العقار من طرف الجماعة تم ربط المشروع بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء تم توفير الحراسة لهذا المرفق تم تدشين المشروع	- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 6 700 000,00 - جماعة انزكان :توفير العقار 336 000.00 - جمعية طبية لرعاية الأيتام : 203 000.00	7 239 000,00	استكمال بناء و تجهيز دار الأطفال بإنزكان
تم توفير العقار من طرف الجماعة تم ربط المشروع بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء تم تسليم المشروع من طرف المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني في إطار اتفاقية الشراكة المتعددة الأطراف	- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 5 500 000,00 * (سنة 2015) . 1 000 000.00 * (سنة 2018) 1000 000.00 - جماعة انزكان: ربط المركب بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء والخدمات المطلوبة	5 500 000,00	بناء و تجهيز المركب الاجتماعي لحماية الطفولة و الفئة الهشة بإنزكان (استكمال شق الأشغال و التجهيز)

	- المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني: توفير العقار		
تمت المصادقة على اتفاقية الشراكة في إطار سياسة المدينة لتأهيل جماعة انزكان من طرف المجلس الجماعي تم إحالة هذه الاتفاقية على القطاعات الحكومية ذات الصلة للتوقيع	- المديرية العامة للجماعات الترابية - قطاع الإسكان وسياسة المدينة - مجلس جهة سوس ماسة - مجلس عمالة انزكان أيت ملول - قطاع السياحة - قطاع الصناعة	652 000 000.00	تأهيل جماعة انزكان في إطار اتفاقية سياسة المدينة
تم صرف مساهمة الجماعة خلال : ● سنة 2021: مبلغ 7 000 000.00 ● سنة 2022: مبلغ 9 000 000.00	- وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) - صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها - الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير - جهة سوس – ماسة - جماعات أكادير الكبير .	2 115 000 000.00	انجاز البرنامج الأولي لمشروع تطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والماء الصالح للشرب بأكادير الكبير
تم توقيع الاتفاقية والتأشير عليها في طور صرف مساهمة الشركاء صاحبة المشروع جماعة أكادير	- وزارة الداخلية - وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - جهة سوس ماسة - جماعة اكادير - جماعة إنزكان - جماعة أيت ملول - جماعة الدشيرة الجهادية - جماعة اورير - جماعة تغازوت - جماعة الدراركة - جماعة القليعة	26 000 000.00	مشروع إحداث وتجهيز مركز لإيواء وتقييم وتلقيح الكلاب والقطط الشاردة على مستوى أكادير الكبير.


عدد الأوراش المبرمجة الخاصة بالمشاريع المشتركة خلال سنة 2022: 26

أوراش منجزة أو في طور الإنجاز

الأوراش المبرمجة والتي اشتغل عليها.

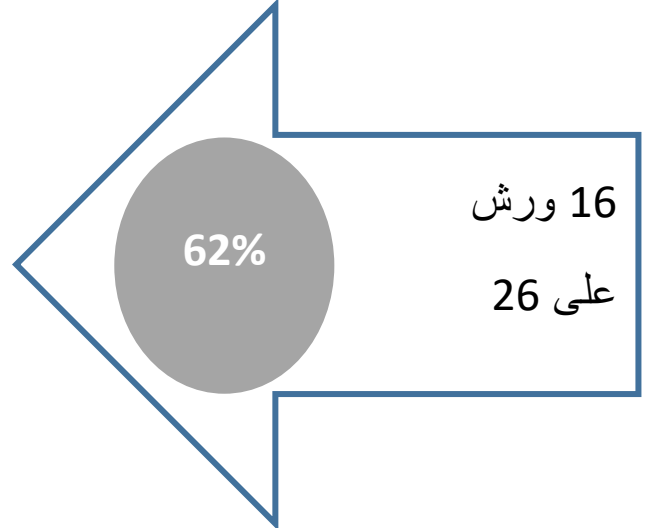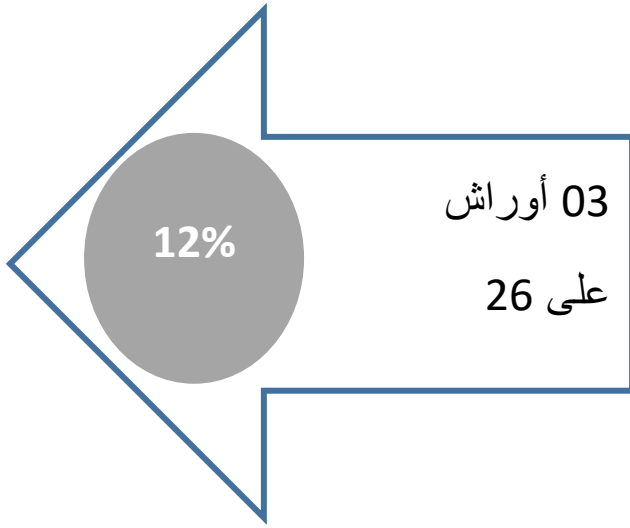

مشاريع منجزة	مشاريع في طور الإنجاز	مشاريع في طور الإعلان عن الصفقة أو في مرحلة الالتزام بالنفقة	مشاريع في طور استكمال الدراسة التقنية	مشاريع في طور توفير الوعاء العقاري	مشاريع في طور توقيع الاتفاقية
02	01	04	08	05	06

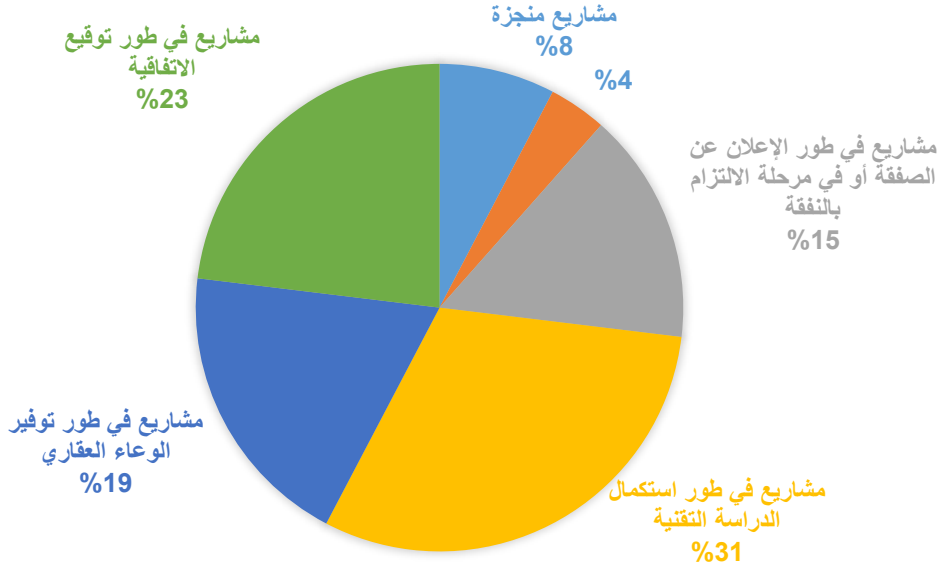

مصفوفة مشاريع الترافع:

الاجراءات التنفيذية المتخذة خلال سنة 2022	الشركاء المحتملين	تسمية المشروع
-	- جماعة إنزكان - مجلس جهة سوس ماسة - وزارة التجارة والصناعة - المجلس الإقليمي - وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)	استقطاب مشاريع ومصانع للمنطقة الجنوبية مثل معامل للتلفيف
-	- وزارة الصحة ووزارة المكلفة بالأسرة والطفولة	الترافع لإحداث مستوصف ومركز للام والطفل خاصة بالرمل وعلي واحمان
-	- وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة	إحداث مؤسسات تعليمية جديدة بكل تراسن والجرف لتفادي الاكتظاظ
-	- وزارة الشباب والثقافة والتواصل	احداث متحف خاص بذاكرة انزكان
-	- وزارة الصحة والشركاء الاخرين	إعادة تأهيل المستشفى بإنزكان

الدراسة في طور الإنجاز من طرف مجلس عمالة انزكان أيت ملول	<ul style="list-style-type: none"> - مجلس الجهة - وزارة التجهيز والماء - وكالة الحوض المائي - وزارة الداخلية 	التعجيل تهيئة الضفة اليمنى لواد سوس (مشروع توادا - الكورنيش)
الدراسة التقنية في طور الإنجاز من طرف الجماعة	<ul style="list-style-type: none"> - وزارة التجهيز والماء والجهة 	اتفاقيات شراكة مع التجهيز والنقل والجهة لتهيئة الشارع المداري جنب واد سوس لفك الضغط عن انزكان في التنقلات
-	<ul style="list-style-type: none"> - الجهة - وزارة النقل واللوجستيك - الجامعات - شركات النقل 	إحداث نقل جامعي لأبناء تراسن لأبناء الجماعة

تقييم تركيبي لتقدم تنفيذ برنامج العمل:

أنجزت أو في طور الانجاز		اشتغل عليها		عدد الأوراش	
النسبة	العدد	النسبة	العدد		
90%	09	100%	10	10	ذاتية
12%	03	62%	16	26	مشتركة
00%	00	25%	02	08	الترافع
28%	12	59%	26	44	المجموع

