

نقيلهم برنامج عمل

الجماعة

2022-2027

السنة الثانية 2023

الفهرس

- 1..... الفهرس
- 2..... تقديم
- 4..... منهجية إعداد برنامج عمل الجماعة
- 6..... عرض تركيبي لبرنامج عمل الجماعة
- 8..... التكلفة التقديرية للمشاريع:
- 13 تقديم تنزيل برنامج عمل الجماعة
- 27 تقييم تركيبي لتقدم تنفيذ برنامج العمل:

تقرير

بعد التأشير على برنامج عمل الجماعة بتاريخ 03 مارس 2023، وجب الوقوف على مدى تقدم الأوراش من خلال تقييم تنزيل البرنامج، ووتيرة تنفيذ الأوراش المتضمنة به. وتعزى أهمية التقييم السنوي لتنفيذ برنامج العمل لأغترارين أساسيين:

1. الضرورة القانونية: تنص المادة 14 من المرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 29 يونيو 2016 والمتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتعبه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده على ان رئيس المجلس يقوم بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة.
2. نجاحة التدبير: بالإضافة لكونه وثيقة عمل داخلية يمكن اغتراره أيضا أداة للقيادة وقناة للإشراك وبالتالي ورقة بوظائف متعددة:

* وثيقة عمل:

- ✓ لتتبع تنفيذ برنامج العمل.
- ✓ لرأسمة إجراءات التدبير بالمشروع ومراكمة التعلمات من الإخفاقات.
- ✓ للتبادل والمقارنة في المجال وفي الزمن مع باقي الجماعات.
- ✓ لتدقيق وتقييم اسهامات الشركاء

* وثيقة للقيادة:

- ✓ تدبير العلاقة مع شركاء الإنجاز والتفاعل
- ✓ وضع منهجية المشروع في التنزيل
- ✓ وضع مؤشرات تقدم واضحة وبسيطة للإنجاز
- ✓ للتقويم وتعديل برنامج

* وثيقة الإشراك:

- ✓ في إطار الإخبار والتشاور والمشاركة.
- ✓ لتقاسم النجاح والأخفاق.
- ✓ لاستخلاص الصعوبات وإعادة تجديد الحاجيات بخصوص العلاقة مع الشركاء.

يجب التأكيد أيضا على أن التقييم السنوي محطة، بمنطق السيرورة "processus"، ضمن عمل المجلس على امتداد مدة انتخابه، وبالتالي وجب التفاعل مع مخرجاته بارتباط مع محطات أخرى، أهمها مسار إقرار برنامج العمل من طرف المجلس والتأشير عليه من طرف سلطة المراقبة الإدارية، حيث:

- ✓ تم التداول بشأنه خلال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2022 المنعقدة بتاريخ 29 دجنبر 2022.
- ✓ تم إرساله الى مصالح العمالة قصد التأشير بتاريخ 14 فبراير 2023.
- ✓ تم التأشير عليه بتاريخ 03 مارس 2023 وتوصلنا به بتاريخ 09 مارس 2023.

منهجية إعداد برنامج عمل الجماعة

نص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في المادة 78 على ما يلي: تضع الجماعة تحت إشرافه رئيس مجلسها برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتعيينه وتقييمه.

بناء عليه، تم إعداد برنامج عمل الجماعة بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وفي التقائية مع برنامج عمل مجلس عمالة انزكان أيت ملول، وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل عمالة انزكان أيت ملول بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح الأمامرية للإدارة المركزية.

انسجاما مع روح نص المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتبعه وتعيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور طبقا لمقتضيات المادة 81 من ذات القانون التنظيمي المشار إليه سلفا، وبشكل خاص مادته السابعة: "يتم إعداد برنامج العمل وفق منهج تشاركي".

هكذا تم إعداد برنامج عمل جماعة انزكان، وفق مجموعة من الأدوات المنهجية التي مكنتها من الانتقال من الإعداد النظري الى التنزيل والأجراة الفعلية لكل العمليات المشكلة لسيرورة بلورة برنامج العمل، وعموما يمكن حصر الأدوات المنهجية المستعملة فيما يلي:

✓ نموذج SWOT

✓ المجموعات البورية التي تم استعمالها خلال التشخيص التشاركي

✓ المقابلات الفردية والجماعية مع مجموعة من الفاعلين ولاسيما الجمعيات

وبعد التشخيص الترابي للمرحلة الأولى لعملية إعداد برنامج عمل الجماعة وبالتالي إنتاج المشاريع التنموية، وهو يعني من منظور التنمية إجراء الملاحظات والجرد الشاملين لمجموع مكونات المجال الترابي.




أما ميادين التشخيص فقد انصبت أثناء إعداد برنامج عمل الجماعة على المستويات التالية:

- الإطار الترابي: بمعنى الرقعة الترابية المعنية بالتنمية.
- الحقل الاجتماعي: وهو مجموع السكان الذين يقطنون بالمجال الترابي والذين تجمعهم علاقات متنوعة ومتعددة ويتقاسمون نفس القيم والمسؤوليات ويواجهون نفس المشاكل.
- الحقل الاقتصادي: ويشمل الموارد الاقتصادية المتوفرة لدى الجماعة إما فعليا أو التي يمكن تعبئتها.
أما أصناف التشخيص المعتمد فهي:
- ❖ التشخيص البيولوجرافي والوثائقي: يتضمن قراءة تحليلية لمنوغرافية الجماعة، تقييم برنامج العمل السابق، وكذا دراسة وتحليل الوثائق ذات الصلة الممسوكة لدى المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية.
- ❖ التشخيص الترابي: والمتجسد من خلال المجموعات البؤرية وورشات التشخيص التشاركي.
- ❖ التشخيص المالي: انصب بشكل أساسي على الإمكانيات المادية للجماعة "المداخل والنفقات" الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة.

عرض تركيبي لبرنامج عمل الجماعة

1. تركيبة برنامج العمل

- **المشاريع الذاتية**
- **المشاريع المشتركة**
- **مشاريع للترافع**



المشاريع الذاتية:

تتضمن ما يلي:

04

البرامج

14

المشاريع

74

الأوراش

44 ورشة	6 مشاريع	البنية التحتية والتجهيزات الأساسية	البرنامج 1
7 اوراش	1 مشروع	تنمية الاقتصاد وتعزيز جاذبية المجال	البرنامج 2
11 ورشة	4 مشاريع	تجويد الخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيهية	البرنامج 3
12 ورشة	3 مشاريع	تأهيل البنيات الإدارية وتأهيل الإدارة	البرنامج 4


التكلفة التقديرية للمشاريع:

المشاريع الذاتية :

النسبة المئوية لكل برنامج في الكلفة الاجمالية	الكلفة التقديرية الاجمالية (مليون درهم)	عدد الاوراش	البرنامج
65%	126.69	44	البنية التحتية والتجهيزات الاساسية
18%	34.3	7	تنمية الاقتصاد وتعزيز جاذبية المجال
11%	21.5	11	تجويد الخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيهية
6 %	11.5	12	تأهيل البنيات الإدارية وتأهيل الإدارة
100 %	193.99	74	المجموع

النسبة المئوية التي يمثلها كل برنامج في العدد الاجمالي للاوراش


تأهيل البنيات الإدارية وتأهيل
الإدارة
%17

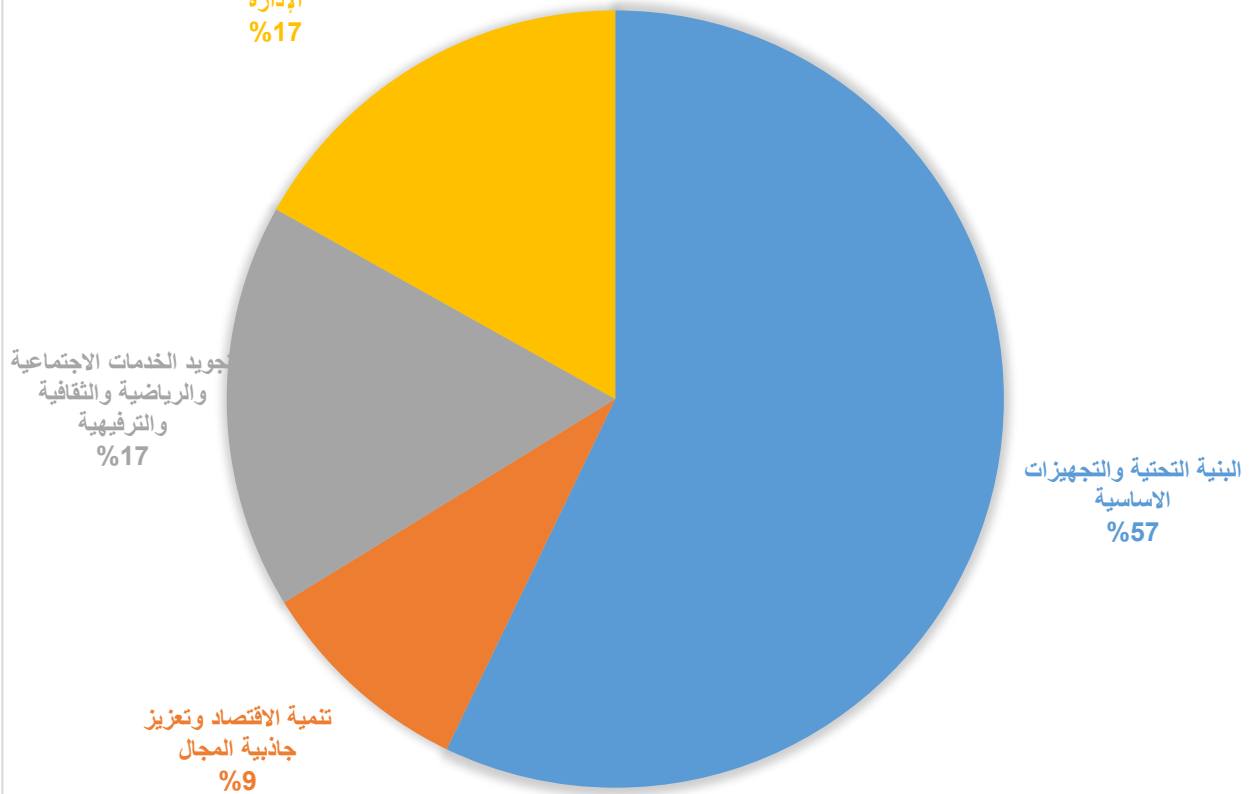

النسب التي يمثلها كل برنامج على حدة في الكلفة الاجمالية التقديرية

تأهيل البنيات الإدارية
وتأهيل الإدارة
%6


تجويد الخدمات الاجتماعية
والرياضية والثقافية
والترفيهية
%11

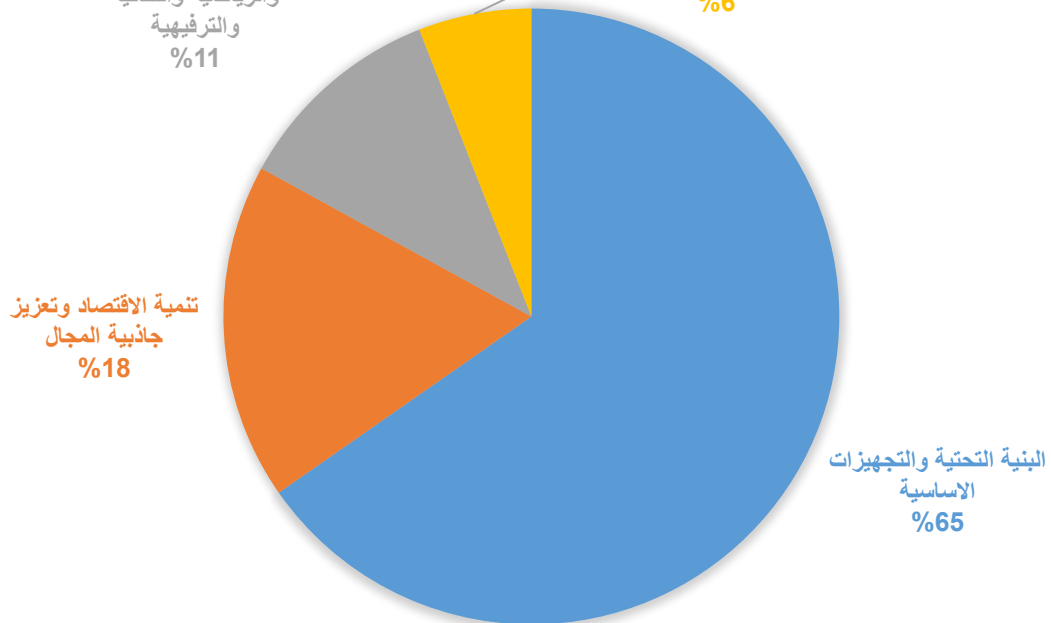

المشاريع المشتركة:

العدد	طبيعة المشاريع
26	مشاريع في إطار اتفاقية سياسة المدينة لتأهيل مدينة إنزكان
25	مشاريع مشتركة أخرى
51	المجموع

النسبة المئوية للمشاريع المشتركة

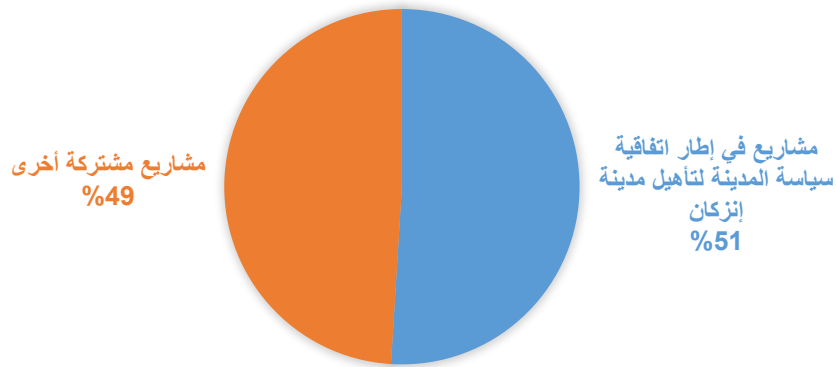

مشاريع الترافع:

الكلفة التقديرية الاجمالية (مليون درهم)	عدد المشاريع
124	8

طرق تمويل مشاريع برنامج عمل الجماعة:

شركاء التمويل

الموارد الذاتية

القروض

تقدم تنزيل برنامج عمل الجماعة

تقييم السنة الثانية 2023

مصفوفة المشاريع الذاتية:

1. برنامج تقوية البنيات والتجهيزات الأساسية:

الملاحظات	الإجراءات المتخذة	المبالغ المقررة برسم سنة 2023	حصة الجماعة المتوقعة أو الملتزم بها ما بين 2022 و2027 (مليون درهم)	الأوراش (أو العمليات)	المشاريع
صفحة رقم 20/2023 بداية إنجازها بتاريخ 2024/01/10.	الدراسات الخاصة بالتهيئة الحضريّة في طور الإنجاز. تم فتح الأظرفة بتاريخ 2023/6/6.	1,8	1,94	إنجاز الدراسات لمختلف مشاريع البنيات التحتية	1.1 الدراسات المرتبطة بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية
قيد الإنجاز	الصفحة رقم 2023/25	0,6	1,7	إنجاز الدراسات اللازمة لمختلف مشاريع التجهيزات الأساسية	
صفحة رقم 26/2023	أنجزت وتم تسلم الأشغال	2	11,5	الصيانة الاعتيادية للطرق	
صفحة رقم 10/2023	أنجزت وتم تسلم الأشغال	1.6	1.6	تهيئة المدارة بين الطريق الدائري والفترة الجديدة	
	يدخل في إطار الاستثمار المتعلق بالتدبير المفوض للمرابد.	2.4	2.4	تهيئة مرصد أمام سوق الحرية	2.1 البنيات التحتية
	-	-	1.5	تهيئة الطريق حمام الشياضمي أمام الإقامة العاملة بالجرف	

	-	-	1	تأهيل المقطع الطريقي بشوارع الحسن الثاني ببازركان	
	-	-	5	تهيئة شارع المختار السوسي	
	-	-	6	تهيئة شوارع (كسيمة، المدارس، مسكينة، اشتوكة)	
	-	-	3	تهيئة مختلف مدارات المدينة	
صفحة 13/2023	تم إنجاز صفقة في حدود 2 مليون درهم وتم تسلمها	4	12	أشغال تبليط الازقة	
	يدخل في إطار تنفيذ البرنامج الاستثماري لعقد التدبير المفوض للمرابد.	6	6	تهيئة المرابد بالمدينة	
صفحة رقم 14/2023	تم إنجازها وتسلم الصفقة	2	11.4	اقتناء عتاد صيانة الانارة العمومية	3.1 الانارة العمومية
تم تسلم الأشغال بتاريخ 2024/09/10	انطلاق الأشغال بتاريخ 2023/10/16	2,4	6.4	تقوية وتوسيع شبكة الانارة العمومية بالمدينة	
	-	-	1.7	ازالة وتحويل الاعمدة الاسمنتية بأزقة المدينة	
- صفحة رقم 2023/24 - سند الطلب	تم إنجازه	0.3	2	التشوير الأفقي والعمودي	4.1 التشوير الطريقي
	لم ينجز	0.3	1.85	علامات الاتجاه	
سند طلب.	تم إنجازه	0.1	0.3	اقتناء لوحات ترقيم الأزقة	
	لم ينجز	0.4	2.4	مخفضات السرعة	

	لم ينجز	0,6	3,6	صيانة المناطق الخضراء	5.1 المناطق الخضراء والساحات وملاعب القرب
الصفحة رقم 06 في طور الفسخ	لم ينجز	1.5	1.5	تأهيل حديقة 20 غشت وحديقتين بالجرف	
الصفحة رقم 09 في طور الفسخ	لم ينجز	1.6	1.6	تأهيل حديقة ابن طفيل	
	لم ينجز	0.8	0.8	تهيئة حديقة المغرب العربي	
	لم ينجز	0.6	0.6	تهيئة الحديقة بشارع محمد الخامس	
	لم ينجز	0.8	0.8	تهيئة حديقة الأمويين	
	لم ينجز	2	10	تهيئة الشريط الأخضر بالجرف	
	-	-	6	تهيئة فضاء ترفيهي بجانب الكولف	
	-	-	0.3	تهيئة حديقة بجانب مقبرة تراست	
	-	-	3	تهيئة الشريط الأخضر على طريق مولاي علي الشريف	
	-	-	0.3	تهيئة حديقة أمام مدرسة النخيل	
	لم ينجز	2	4,5	توسيع شبكة المياه العادمة المعالجة لسقي المناطق الخضراء	
	لم ينجز	1,8	1.8	تهيئة ساحة مقر جماعة انزكان	
	-	-	3	تهيئة ساحات عمومية بأحياء المدينة	

	لم ينجز	1	1	احداث ثلاث ملاعب للقرب بملعب انزكان	
	لم ينجز	1	1	احداث ثلاث ملاعب للقرب بملعب تراست	
	لم ينجز	0.5	0.5	تأهيل ملعب القرب أمام مقاطعة الجرف	
	-	-	1	إحداث ملعب القرب أمام مؤسسة المتنبى	
	-	-	1	إحداث ملعب القرب بتراست (أمام المحافظة)	
	-	-	0.5	تأهيل ملعب الحي الحسني- تغزوت - بانزكان	
	-	-	0.5	تأهيل مساحة اللعب قرب مؤسسة رحال ابن احمد الرمل	
	-	-	0.5	تأهيل ملعب قرب مقبرة الجرف	
صفحة رقم 07/2023	تم إنجازها وتسلمها	0,45	2	حواجز وقائية	6.1 التآييث الحضري
	لم ينجز	0.3	1,1	كراسي حضرية	
	لم ينجز	0.1	0.1	اقتناء خيم	

2. برنامج تنمية الاقتصاد وتعزيز جاذبية المجال:

المشاريع	الأوراش (او العمليات)	حصة الجماعة المتوقعة أو الملتزم بها (مليون درهم)	المبالغ المقررة برسم سنة 2023	الإجراءات المتخذة	ملاحظات
1.2 التنمية التجارية والاقتصادية	توسيع سوق الخضر والفواكه للجملة ونصف الجملة	24	24	لم ينجز	تمت الموافقة على هذا المشروع من طرف لجنة المشاريع الكبرى (منصة رخص) وسيتم تنفيذه في إطار التدبير المفوض للمرافق العمومية الجماعية
	إحداث محطة تحويل كهربائي بسوق الخضر والفواكه للجملة ونصف الجملة	2	2	لم ينجز	تمت مراسلة المكتب الوطني للكهرباء بتاريخ 2024/03/22 من أجل إعداد الدراسة، في أفق الإعلان عن طلب العروض
	تأهيل الجناح 8 بسوق الثلاثاء	3,6	3,6	لم ينجز	تم توقيع اتفاقية شراكة مع جمعية تجار وحرفي الجناح 8 في أفق إنجاز المشروع في إطار هذه الاتفاقية
	تأهيل سوق الثلاثاء	1	1	لم ينجز	-
	إحداث محطة تحويل كهربائي بسوق الثلاثاء	1.4	1.4	لم ينجز	-
	تأهيل السوق الأسبوعي الجديد	1	1	لم ينجز	-
	تأهيل المحطة الطرقية المؤقتة	1.3	1.3	لم ينجز	تم إعداد الدراسات التقنية عن طريق سند طلب، في أفق الإعلان عن طلب عروض إيجار هذا المرفق
	-	-	-	-	-


3. برنامج تجويد الخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيهية:

المشاريع	الاوراش (او العمليات)	حصة الجماعة المتوقعة أو الملتزم بها (مليون درهم)	المبالغ المقررة برسم سنة 2023	الاجراءات المتخذة	ملاحظات
1.3 المركبات الاجتماعية	تجهيز المركب الاجتماعي بتراس	0.6	0.6	لم ينجز	في طور الالتزام بالنفقة
	تجهيز دار الحي بالجرف	0.4	0.4	بداية تنفيذ الصفقة 2023/12/22	تم إنجازها وتسلمها خلال سنة 2024
2.3 الملاعب الرياضية	تأهيل وصيانة الملاعب:	انزكان	0.9	تم انجازه	تم تسلم الأشغال بتاريخ 2024-01-05
		الجرف	1.7	لم ينجز	-
		تراس	1	تم إنجازها وتسلمه	تسلمت الأشغال بتاريخ 2023-12-22
	تهينة واجهة ملعب انزكان	3	-	-	-
	تأهيل القاعة متعددة الخدمات انزكان (عبد القادر بن محمد أوبيهي)	2	2	تم إنجازها وتسلمها	صفقة رقم 11/2023
	تأهيل وصيانة قاعة عبد القادر بن محمد اوبيهي	0.3	0.3	لم ينجز	-
بناء القاعة المغطاة للرياضة بتراس	7,5	7,5	لم ينجز	-	
3.3 الخدمات الثقافية	إعادة تأهيل الصالون الثقافي	0,5	0,5	لم ينجز	-
	تهينة وتجهيز المسرح الجماعي	0,4	0,4	تم إنجازها وتسلمه	صفقة رقم 08/2023
4,3 الخدمات الترفيهية	تجهيز الساحات والمناطق الخضراء بألعاب الأطفال	1.2	0,3	تم إنجازها وتسلمه	صفقة رقم 22/2022
	تجهيز الساحات والمناطق الخضراء بالتجهيزات الرياضية	2	0,5	تم إنجازها وتسلمه	صفقة رقم 05/2023

4. برنامج تأهيل البنيات الإدارية وتحديث الإدارة:

المشاريع	الاوراش (او العمليات)	حصة الجماعة المتوقعة أو الملتزم بها (مليون درهم)	المبالغ المقررة برسم سنة 2023	الاجراءات المتخذة	ملاحظات
1,4 تحديث الإدارة	انشاء الموقع الالكتروني للجماعة	0,1	0,1	تم إنجازه وتسلمه	
1.4 تحديث الإدارة	اقتناء العتاد المعلوماتي والبرانيم	2,2	1,8	تم إنجازه وتسلمه	الصفحة رقم 28/2023
	تجهيزات مكتبية	0,3	0,3	لم ينجز	-
	تأهيل قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة	0,8	0,8	لم ينجز	-
	اقتناء سيارات نفعية	0,85	0,4	تم إنجازها وتسلمها	-
2,4 تأهيل البنيات الإدارية	تأهيل المحجز الجماعي	1	0,5	-	صفحة رقم 10/2022 الأشغال متوقفة في انتظار تفريغ مكان إنجاز الأشغال بعد عملية البيع
	تأهيل المستودع الجماعي	0,9	0,4	تم إنجازه	صفحة رقم 23/2023
	تجهيز مرافق الجماعة بكاميرات المراقبة	0,4	0,2	لم ينجز	-
	بناء ملحقة ادارية بالجرف قرب بريد المغرب	1,3	-	-	-
	إعادة بناء ملحقة ادارية بتراست	3	-	-	-
	تجهيز مقر تصحيح الامضاء بالجرف	0,2	0,2	لم ينجز	-
	التكوين المستمر	0,45	0,15	تنظيم دورتين تكوينيتين تم تأطيرهما من طرف الاكاديمية المدنية للديموقراطية وحقوق الانسان	-
	3.4 التكوين المستمر				

عدد الأوراش المبرمجة الخاصة بالمشاريع الذاتية خلال سنة 2023: 57

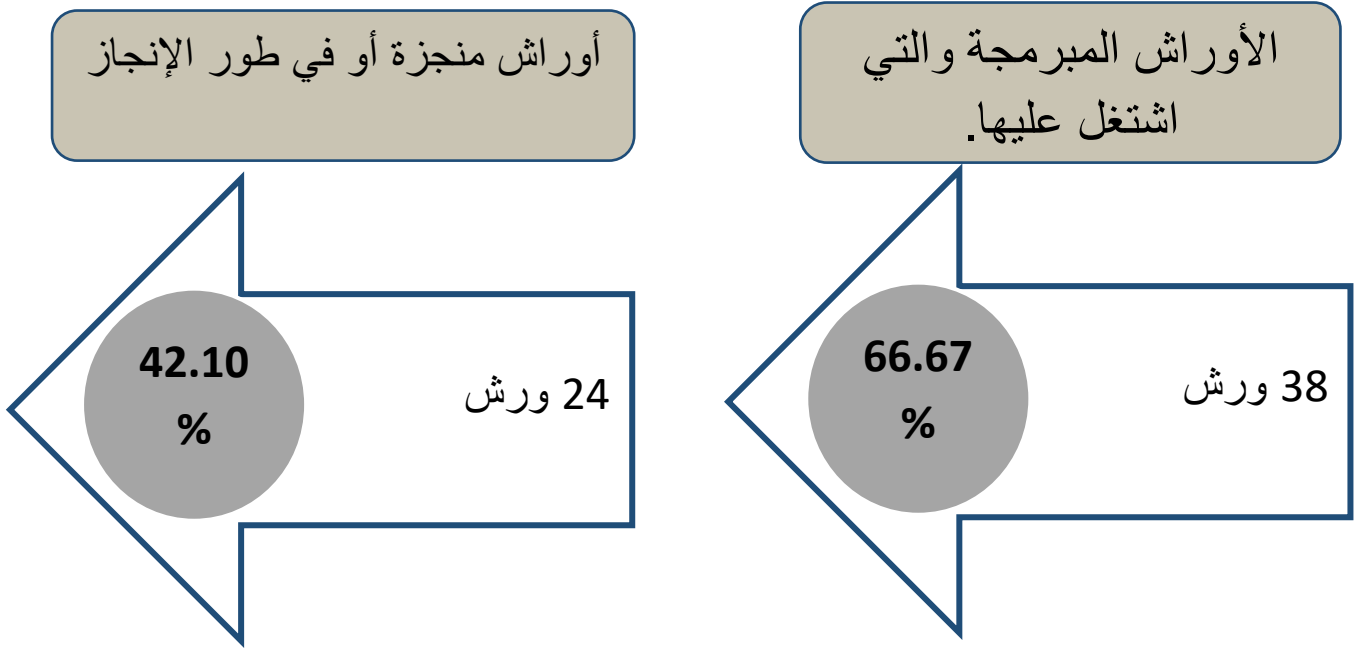

<u>المفسوخة</u>	<u>المنجزة</u>	<u>عدد الأوراش</u>
02	24	57

مصفوفة المشاريع المشتركة:

المشروع	التكلفة التقديرية للمشروع	الشركاء ومساهماتهم المالية	الاجراءات التنفيذية المتخذة خلال سنة 2023
احداث وحدة القرب للذبح والبيع لفائدة أصحاب الدواجن	7 100 000.00	- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : 00 4 000 000 - جماعة انزكان: 1 200 000.00 - المستفيدين : 1 900 000.00	في طور الإنترام بالنفقة
احداث وحدة للقرب لتتقية المنتجات البحرية لفائدة منظفي الأسماك	2 000 000.00	- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : 2 000 000.00 - جماعة انزكان (توفير العقار)	تم الإعلان عن طلب العروض الخاص بإتجاز المشروع
أشغال وضع الولوجيات على مستوى المركز الحضري لمدينة انزكان	2 500 000.00	- جماعة انزكان: 2 000 000.00 - المجلس عمالة انزكان أيت ملول 500 000.00	-
أشغال بناء ملعب القرب بثانوية حسن الخياط	1 400 000.00	- جماعة انزكان: 800 000,00 - المجلس الإقليمي: 600 000,00	الاشغال في طور الانجاز
دراسة وأشغال بناء منشأة فنية على مستوى واد سوس بالطريق الجديدة التي تربط حي النخيل بإنزكان وحي تمزارت بأيت ملول	36 000 000.00	- جهة سوس ماسة 14 000 000,00 - مجلس عمالة انزكان أيت ملول: 5 000 000 ,00 - جماعة انزكان: 10 000 000,00 - جماعة أيت ملول: 7 000 000,00	نسبة الإنجاز وصلت 70% (الإنجاز من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع)
أشغال بناء السويقة الجديدة بتراست	15 000 000.00	- جماعة انزكان: 7 000 000.00 - الشركاء: 8 000 000.00	تم الإعلان عن طلب العروض الخاص بإتجاز المشروع
أشغال بناء السوق النموذجي بالجرف	10 000 000.00	- جماعة انزكان: 4 000 000,00 - الشركاء: 6 000 000,00	في طور الإعلان عن الاستشارة المعمارية الخاصة بالمشروع
تأهيل السويقة القديمة بتراست	2 500 000.00	- جماعة انزكان: 1 800 000.00 - الشركاء: 700 000.00	-
أشغال بناء مسبح نصف اولمبي بإنزكان	6 000 000,00	- جماعة انزكان: 2 000 000,00 - باقي الشركاء: 4 000 000,00	-
أشغال بناء مسبح بالجرف	4 000 000.00	- جماعة انزكان: 2 000 000,00 - باقي الشركاء: 2 000 000,00	-

سيتم الإعلان عن طلب العروض بعد إنجاز الأشغال الخاصة بالطريق الدائري بانزكان	-جماعة انزكان: 2 000 000,00- -باقي الشركاء: 5 000 000,00	7 000 000.00	الانارة العمومية بالطاقة الشمسية بالطريق الدائري بانزكان
تم إنجاز الدراسة في طور الإعلان عن طلب العروض الخاص بالأشغال	-جماعة انزكان: 3 000 000,00- -باقي الشركاء: 4 000 000,00-	7 000 000.00	احداث الملعب الكبير قرب ساحة السعادة بانزكان
تم التوقيع على الاتفاقية من طرف جميع الشركاء	-جماعة انزكان : 600 000,00 -المجلس الاقليمي:1000000,00 -جماعة ايت ملول200 000.00	1 800 000.00	انجاز دراسة تقنية لتهيئة وحماية ضفاف واد سوس من الفيضانات على مستوى جماعتي انزكان وأيت ملول
تم إنجاز الأشغال وتسلمها من طرف المجلس الإقليمي لإنزكان ايت ملول	-جماعة انزكان: 1 000 000,00 -المجلس الاقليمي: 1 500 000.00 -وزارة البيئة : 7 500 000.00	10 000 000.00	مشروع تنقية ضفاف واد سوس من النفايات الهامدة
تم الإعلان عن طلب العروض من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع	-جماعة انزكان: 2 000 000.00 -وزارة الثقافة : 12 000 000.00 -جهة سوس ماسة : 4 000 000.00 -مجلس عمالة انزكان ايت ملول: 2 000 000.00 -الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الاركان: 4 000 000.00	24 000 000.00	تاهيل قصبه انزكان
-	-جماعة انزكان: 1 000 000.00 -باقي الشركاء: 500 000.00	1 500 000.00	احداث ملاعب كرة التنس
-	-جماعة انزكان: 10 000 000.00 -جماعة أيت ملول : -وزارة الصحة : -باقي الشركاء:	150 000 000.00	بناء مستشفى اقليمي بأيت ملول
في انتظار إعداد الاتفاقية	-جماعة انزكان: 2 000 000.00 -وزارة الصحة: 500 000.00	2 500 000.00	بناء وتجهيز المركز الصحي الحضري بالرمل انزكان



بناء وتجهيز المركز الصحي الحضري بتراس انزكان	جماعة انزكان: 2 000 000.00 -وزارة الصحة 500 000.00	2 500 000.00	في انتظار إعداد الاتفاقية
تأهيل مصلحة الجراحة والتطبيب بالمركز الاستشفائي الاقليمي	جماعة انزكان: 1 500 000.00 جماعة ايت ملول 1 500 000.00 جماعة الشيرة: 1 500 000.00 -المجلس الجهوي لسوس ماسة : 1 500 000.00 -وزارة الصحة : 3 000 000.00	9 000 000.00	في انتظار إعداد الاتفاقية
استكمال بناء و تجهيز دار الأطفال بانزكان	-المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 6 700 000,00 جماعة انزكان :توفير العقار 336 000.00 -جمعية طيبة لرعاية الأيتام : 203 000.00	7 239 000,00	تم إنجازها وتسلمها برسم سنة 2023
بناء و تجهيز المركب الاجتماعي لحماية الطفولة و الفئة الهشة بانزكان (استكمال شق الأشغال و التجهيز)	-المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 5 500 000,00 (سنة 2015) 1 000 000 ,00 (سنة 2018) 1000 000.00 جماعة انزكان: ربط المركب بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء والخدمات المطلوبة -المندوبية الاقليمية للتعاون الوطني: توفير العقار	5 500 000,00	تم إنجازها وتسلمها برسم سنة 2023
تأهيل جماعة انزكان في إطار اتفاقية سياسة المدينة	-المديرية العامة للجماعات الترابية -قطاع الإسكان وسياسة المدينة -مجلس جهة سوس ماسة -مجلس عمالة انزكان أيت ملول -قطاع السياحة -قطاع الصناعة	652 000 000.00	في انتظار توقيع الاتفاقية من طرف جميع الشركاء
انجاز البرنامج الأولي لمشروع تطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والماء الصالح للشرب بأكادير الكبير	- وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) -صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها -الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير -جهة سوس – ماسة -جماعات أكادير الكبير.	211500000,00	الإنجاز من طرف الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات. وصلت نسبة الإنجاز %30

<p>تم التوقيع على الاتفاقية من طرف جميع الشركاء</p>	<p>-وزارة الداخلية -وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات -جهة سوس ماسة -جماعة اكادير -جماعة إنزكان -جماعة أيت ملول -جماعة الدشيرة الجهادية -جماعة أورير -جماعة تغازوت -جماعة الدراكة -جماعة الفليعة</p>	<p>26 000 000.00</p>	<p>مشروع إحداث وتجهيز مركز لإيواء وتعقيم وتلقيح الكلاب والقطط الشاردة على مستوى أكادير الكبير.</p>
---	--	----------------------	--

عدد الأوراش المبرمجة الخاصة بالمشاريع المشتركة خلال سنة 2023: 25 ورش


أوراش منجزة أو في طور الإنجاز

الأوراش المبرمجة والتي اشتغل عليها.

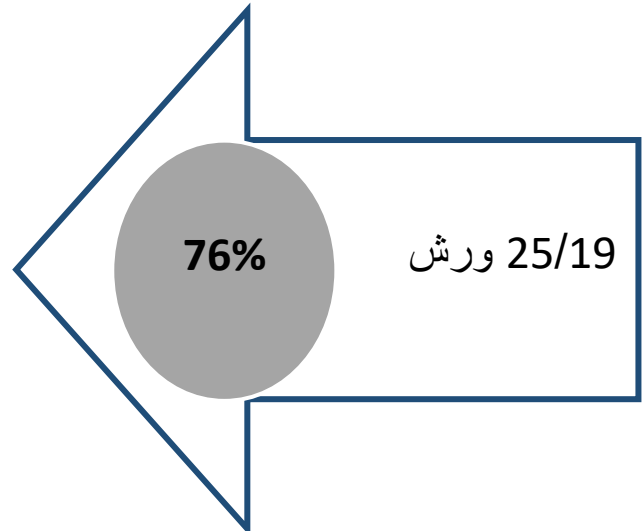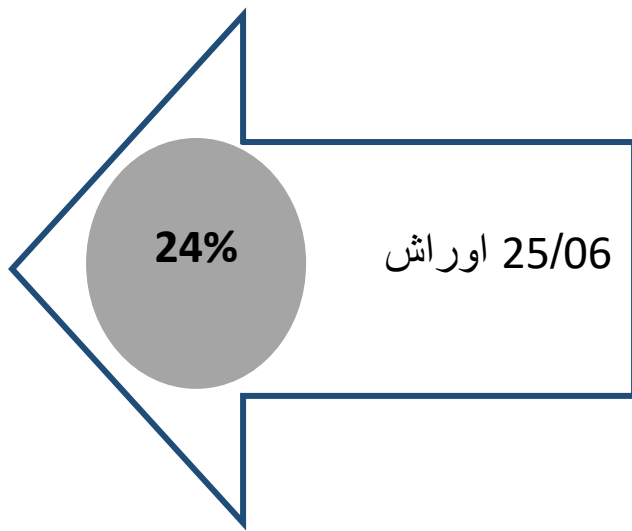

مشاريع منجزة	مشاريع في طور الإنجاز	مشاريع في طور الإعلان عن الصفقة أو في مرحلة الالتزام بالنفقة	مشاريع في طور توقيع الاتفاقيات	مشاريع في طور اعداد الاتفاقيات الاتفاقية
03	03	7	03	03

المشاريع المشتركة

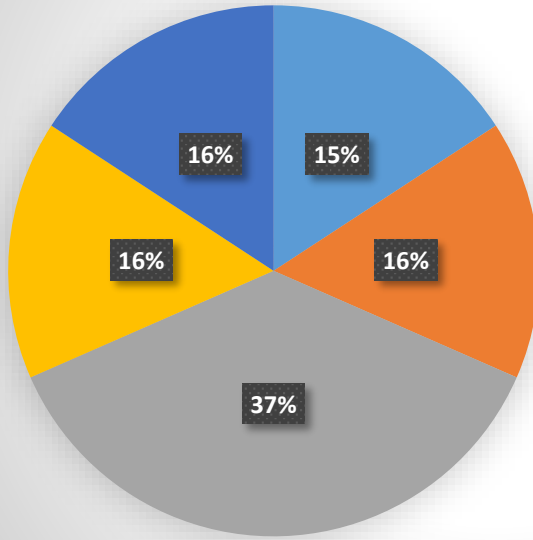

- مشاريع منجزة
- مشاريع في طور الإنجاز
- مشاريع في طور الإعلان عن الصفقة أو في مرحلة الالتزام بالنفقة
- مشاريع في طور توقيع الاتفاقيات
- مشاريع في طور اعداد الاتفاقيات الاتفاقية

مصفوفة مشاريع الترافع:

الاجراءات التنفيذية المتخذة خلال سنة 2023	الشركاء المحتملين	تسمية المشروع
-	- جماعة إنزكان - مجلس جهة سوس ماسة - وزارة التجارة والصناعة - المجلس الإقليمي - وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)	استقطاب مشاريع ومصانع للمنطقة الجنوبية مثل معامل للتلفيف
تمت الموافقة خلال دورة يوليوز 2024 على اقتناء عقار لإحداث مستوصف	- وزارة الصحة ووزارة المكلفة بالأسرة والطفولة	الترافع لإحداث مستوصف ومركز للأم والطفل خاصة بالرمل وعلي واحمان
تم احداث مؤسسة الإمام الغزالي بتراست مؤسسة الهدى في طور الإنجاز	- وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة	إحداث مؤسسات تعليمية جديدة بكل تراست والجرف لتفادي الاكتظاظ
-	- وزارة الشباب والثقافة والتواصل	احداث متحف خاص بذاكرة انزكان
تم التوقيع على الاتفاقية من طرف جميع الشركاء	- وزارة الصحة والشركاء الاخرين	إعادة تأهيل المستشفى بإنزكان
تم إدراجه بتصميم التهيئة الجديد، في انتظار انجاز الدراسات اللازمة	- مجلس الجهة - وزارة التجهيز والماء - وكالة الحوض المائي - وزارة الداخلية	التعجيل تهيئة الضفة اليمنى لواد سوس (مشروع توادا - الكورنيش)
سيتم تهيئته من طرف الجماعة	- وزارة التجهيز والماء والجهة	اتفاقيات شراكة مع التجهيز والنقل والجهة لتهيئة الشارع المداري جنب واد سوس لفك الضغط عن انزكان في التنقلات
-	- الجهة - وزارة النقل واللوجستيك - الجامعات - شركات النقل	إحداث نقل جامعي لأبناء تراست لأبناء الجماعة

تقييم تركيبي لتقدم تنفيذ برنامج العمل:

الأوراش التي أنجزت أو في طور الانجاز		الأوراش التي اشتغل عليها		عدد الأوراش	
النسبة	العدد	النسبة	العدد		
42.10%	24	66.67%	38	57	ذاتية
24%	06	76%	19	25	مشتركة
25%	02	62.5%	05	08	الترافع
30.37%	32	68.39%	62	90	المجموع

الرئيس

